



## COMPTE RENDU

### COMITE DE PILOTAGE DU CTMA DU JAVO 3 DECEMBRE 2019

Délégués présents : Robert GESLOT  
Adélaïde DEJARDIN  
Philippe SAUVAGE  
Sophie BOULIN  
Jacques MAIGNAN  
Rémy LENORMAND  
Yannick COQUELIN  
Roger GOBE  
Elisabeth ROBIN  
Guy DELAMARCHE  
Christian RAIMBAULT  
Michel FORTUNE  
Louis MICHEL  
Gérard GOISBEAULT

*Délégués excusés : Louis BONNEAU  
Guillaume AMIARD  
Claude GEORGET  
Eric MONTAUBAN  
Fabrice PAUMARD  
Michel FORET  
Bruno MAURIN*

Partenaires présents : DDT de la Mayenne : ..... Jean-Pierre ROCHE et Lénaïg LHERBIER  
AFB de la Mayenne : ..... Fabrice GOUBIN  
Agence de l'Eau Loire Bretagne : ..... Raphaël CHAUSSIS  
Conseil Départemental 53 : ..... Sarah FAUCONNIER  
Fédération de Pêche de la Mayenne : ..... Jean POIRIER et Alain CHAMBRELAN  
Association riverains Jouanne et Vicoin : ..... Patrick CACHEUX et Bernard BELLIER  
Mayenne Nature Environnement : ..... Patrick MUR

*Partenaires excusés : SAGE de la Mayenne : ..... Astrid PICHODO*

**BASSIN DU VICOIN**

Travaux	Lieu	Coût en € TTC	Réalisation
Abattage ripisylve	Parc du Plessis - LE GENEST ST ISLE	2 000	Décembre 2019
Restauration ruisseau et zone humide	La Cailletière - LE BOURGNEUF LA FORET	41 898	Septembre 2019
Continuité écologique	Morfelon - LE BOURGNEUF LA FORET	46 380 <i>(29 094 + 1 500)</i>	Octobre 2019
Restauration zone humide	La Rouzinière - LE GENEST SAINT ISLE	5 880	Juillet 2019
Reprise de berges	Pont Alain - SAINT BERTHEVIN	6 840	Juillet 2019
Passe à anguilles Régalage vases, muret	Bas Coudray - LE GENEST SAINT ISLE	9 480	Septembre 2019
Suppression plans-d'eau	La Potinière - MONTIGNE / AHUILLE	54 655	Oct. 2019 - Interrompu
Embâcles		12 000	Juillet - Décembre 2019
	<b>TOTAL</b>	<b>151 347</b>	
	<b>TOTAL Prévu</b>	<b>162 600</b>	



*Contournement du plan d'eau de Morfelon au  
BOURGNEUF LA FORET*



*Aménagement de la zone humide de la Collerais  
au BOURGNEUF LA FORET*

## BASSIN DE LA JOUANNE

Travaux	Lieu	Coût en € TTC	Réalisation
Entretien / Embâcles/Plantes envahissantes	EVRON, MONTSURS, ENTRAMMES, ARGENTRE, FORCE	12 200	Juillet-Octobre 2019
Continuité écologique	Moulin Neuf - ARGENTRE* (hors communication)	104 148	Septembre 2019
Continuité écologique + frayère	Petit Chéré - PARNE SUR ROC	69 036	Juillet 2019 – Interrompu Reporté 2020
Continuité écologique	Nayères - STE GEMMES LE ROBERT	4 500	Septembre 2019
Continuité écologique	Culoison - STE GEMMES LE ROBERT	7 640	Septembre 2019
Protection du lit et berges	Culoison - STE GEMMES LE ROBERT	11 994	Septembre 2019
Passe à anguille	La Roche, Argentré	(7 000)	Etude fin 2019 reporté 2020
	<b>TOTAL</b>	<b>209 518</b>	
	<b>TOTAL Prévu</b>	<b>238 680</b>	

Mme BOULIN, vice-présidente du Syndicat JAVO, en charge du bassin de la Jouanne, précise que la fin des travaux sur le site du Petit Chéré à PARNE SUR ROC est reporté à 2020, faute de conditions météorologiques favorables.



*Aménagement du Moulin Neuf à ARGENTRE*

A noter : La rampe en enrochement réalisée au Moulin Neuf à ARGENTRE compte près de 300 blocs d'enrochement.

## BASSIN DE L'OUETTE

Travaux	Lieu	Coût en € TTC	Réalisation
Entretien /Embâcles	Bourg de LA CHAPELLE-RAINSOUIN à Pont-Pineau, SOULGE SUR OUETTE	8 800	Juillet-Octobre 2019
Continuité écologique	Petits ouvrages (2)	4 200	Juillet 2019
Restauration et protection du lit et des berges	1 km	60 468	Juillet 2019
Restauration zone humide	Réouverture ZH	2 880	Juillet 2019
	<b>TOTAL</b>	<b>76 076</b>	
	<b>TOTAL Prévu</b>	<b>69 000</b>	



*Renaturation de l'Ouette à NUILLE SUR OUETTE*

## BASSIN DE LAVAL AFFLUENTS

Travaux	Lieu	Coût en € TTC	Réalisation
Entretien /Embâcles	Moyette - ST GERMAIN LE FOUILLOUX	2 460	Septembre 2019
Continuité écologique	Petits ouvrages (2)	3 600	Septembre 2019
Restauration et protection du lit et des berges	0.9 km	18 691	Septembre 2019
	<b>TOTAL</b>	<b>24 751</b>	
	<b>TOTAL Prévu</b>	<b>20 041</b>	



*Restauration de la Moyette à ST GERMAIN LE FOUILLOUX*

M. MICHEL, vice-Président du Syndicat JAVO, en charge du bassin de Laval Affluents, indique la Moyette est un affluent de la Mayenne, il se situe en amont de CHANGE.

M. MICHEL précise également que des passages petites faunes ont été demandés par la DDT, ces aménagements seront réalisés en 2020.

**BILAN DES ETUDES CTMA 2019**

Etudes	Lieu	Coût en € TTC	Réalisation
Dossier DIG + DLE	Jouanne, Vicoin, Laval affluents	60 300 (13 500)	Terminé 20/11
Indicateurs	Ouette, Jouanne, Vicoin	9 600	Juillet 2019
Offre pédagogique	Bassin Vicoin	13 000	10 écoles + 3 établissements
Habitats salmonicoles	Montbesnard, ARGENTRE	8 064	Restitution 10/12
Etudes ouvrages sur l'Ouette	Moulin de Souvray Moulin de la Hune BAZOUGERS	23 568	Rendus 2019 Travaux 2020 (?)

**OFFRE PEDAGOGIQUE (Ecoles du bassin du Vicoin)**

Ecoles primaires			
Ecole Jeanne d'Arc	ST BERTHEVIN	CM1	27
Ecole Jeanne d'Arc	ST BERTHEVIN	CM2	19
Ecole la Forêt	ST BERTHEVIN	CM1	28
Ecole Victor Hugo	NUILLE / VICOIN	CM1/CM2	23
Ecole Notre Dame	NUILLE / VICOIN	CE2/CM1/CM2	21
Ecole St Joseph	BOURGON	CM1/CM2	12
Ecole Jacquard	GENEST-ST ISLE	CM1	18
Ecole Jacquard	GENEST-ST ISLE	CM2	30
Ecole Saint-Joseph	LOIRON	CE2/CM2	24
Ecole pub Hilard	LAVAL	CM1	22
			<b>224</b>



Ecoles secondaires			
MFR	ST BERTHEVIN	Term Bac Pro	10
MFR	ST BERTHEVIN	1er CGEA Bac Pro	10
Lycée agricole	LAVAL	1er STAV	7
			<b>27</b>

Ces animations pédagogiques seront réalisées en collaboration avec Mayenne Nature Environnement et la Fédération de pêche de la Mayenne.

## SUIVI INDICATEURS


> Sur la Jouanne (au droit du plan d'eau d'ARGENTRE) :

Nom commun	code	Probabilité de présence théorique	Effectif capturé	% d'effectif
Loche franche	LOF	0,9607	208	18,60
Goujons	GOX	0,9257	37	3,31
Vairons	PHX	0,9104	34	3,04
Chevaine	CHE	0,8461	232	20,75
Gardon	GAR	0,7505	210	18,78
Anguille	ANG	0,7020	4	0,36
Chabot	CHA	0,6320	206	18,43
Perche	PER	0,6159	9	0,81
Ablette	ABL	0,6085	10	0,89
Traites (TRF, TRM, TRL)	TRF	0,5708		
Barbeau fluviatile	BAF	0,5427	57	5,10
Vandoises (VAN, VAR)	VAN	0,5105	102	9,12
Brochet	BRO	0,4249	1	0,09
Spirin	SPI	0,3842		
Perche soleil	PES	0,3837	3	0,27
Tanche	TAN	0,3194		
Carpes (CCO, CMI, CCU)	CCO	0,2487		
Brèmes (BRE, BRB, BRX)	BRE	0,2375	5	0,45

Valeur totale de l'IPR	14,999
Etat écologique	bon

Il s'agit de très bons résultats, seulement 2 ans après les travaux. L'état écologique passe de Mauvais à Bon.

**LANCEMENT PROCEDURE POUR LE NOUVEAU CONTRAT TERRITORIAL EAU (CT Eau)**

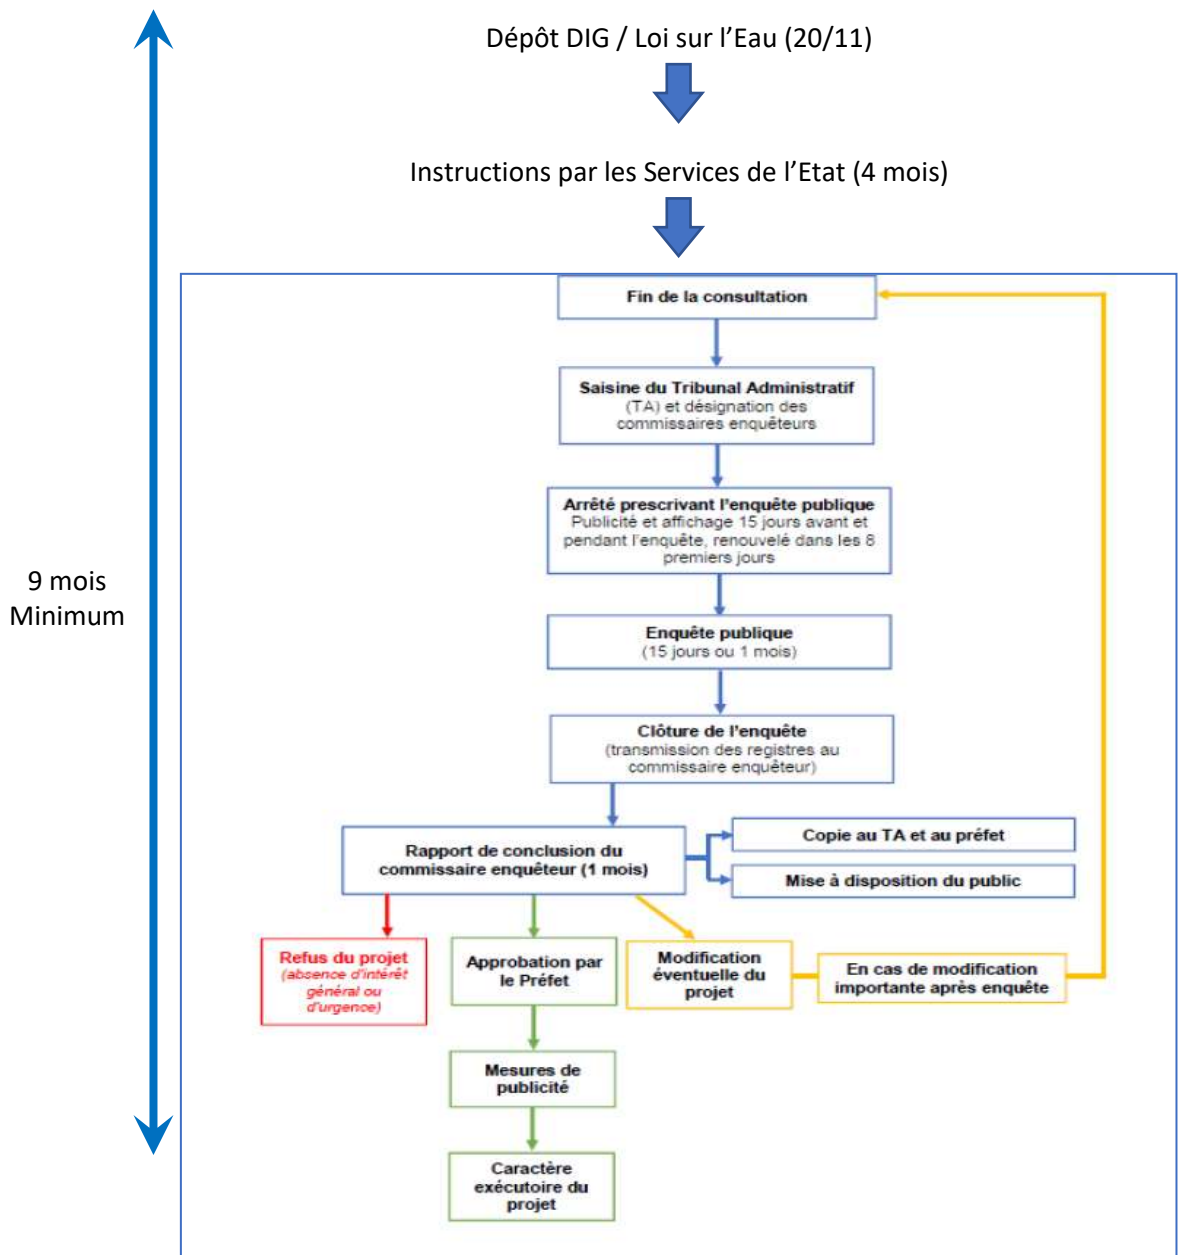

Le dossier DIG a été déposé le 20 novembre 2019 à la DDT, le délai d’instruction est de 9 mois minimum.

Durant l’enquête publique, le commissaire enquêteur devrait assurer 3 permanences sur le territoire du JAVO.

Du fait de l’instruction du dossier DIG et de son passage en enquête publique, pas de travaux possibles en 2020 sauf interventions non soumises à DIG et Déclaration de loi sur l’eau.

Seuls les travaux sur l’Ouette sont possibles, car la DIG relative à l’Ouette a été validée en 2018.

## PROGRAMME DE TRAVAUX 2020

Bassin	Actions	Montant prévisionnel (€ TTC)
Ouette	Restauration lit et berges + continuité + suivis	140 000 €
Laval Affluents	Etude Ouvrages Saint Nicolas + Renaturation Saint Nicolas + Passages faune sur Moyette	45 000 €
Vicoïn	RAR Plans d'eau	-
Jouanne	RAR Ouvrages	-
Ensemble JAVO	Embâcles + Entretien+ Plantations+ Communication	45 000 €

### RESTAURATION DE L'OUETTE – PROJETS 2020



#### Secteurs concernés :

- > De l'amont vers l'aval : du Pont Pineau à Souvray (BAZOUGERS)
- > Ruisseaux de Champagnette, Attelées et Aunay.

#### Problématiques rencontrées :



Abreuvoirs sauvages > 20 (restauration du lit)  
Absence clôtures > 1 km (charge propriétaires)



Embâcles  
(À définir)





Seuils sauvages (= 5)



Pont à rendre franchissable (=4)



Ouvrages hydrauliques illégaux (=1)



Moulins (=3)  
 - Souvray à BAZOUGERS  
 - Hune à BAZOUGERS  
 - Petit Bozée à ?

**RESTAURATION DU SAINT NICOLAS – PROJETS 2020**



Travaux proposés par la commission Laval Affluents :

- Recharges + banquettes + diversification + clôtures
- Etude « ouvrages »
- Entretien végétation

### QUESTIONS DIVERSES

- *Installation de la caméra Riverwatcher :*

Nicolas BOILEAU explique que la caméra a été installée le 31 octobre dernier au niveau de la passe à poissons au Moulin du Bas Coudray au GENEST ST ISLE.



- Gestion à distance (internet)
- Passage de poissons en continu
- Environ 900 évènements à traiter

> Support pédagogique très intéressant

Le Président  
Robert GESLOT

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'R. Geslot', is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'SYNDICAT DE BASSIN', 'Javo', and '53870 CHANBE'. The stamp is partially obscured by the signature.
